

Baustellendossier NalpSolar

Einführung & Unterweisung neue Mitarbeitende – Stahlbau / Vormontage Tal



Ausgabe	30.07.2026 (Einsatzbeginn Do 30.07.2026, 07:00 Uhr, IP Tal 1 Sedrun)
Gültig für	Vormontage Stahlbau im Tal – aktuell Bereich 26_2.2
Erstellt	V. Malt, Bauführer STRABAG AG, 29.07.2026
Inhalt	1 Allgemein · 2 Sicherheit · 3 Vormontage · 4 Bauablauf · Unterweisungsnachweis

1

Allgemein

Das Projekt in Kürze & eure Ansprechpartner

Der Modultisch & die Pfähle S1–S4

Standort und Logistikkette Tal → Berg

1 · Das Projekt in Kürze


Am **Cuolm Nalps** oberhalb Sedrun (GR, ca. 2'000 m ü. M.) baut STRABAG eine der grossen hochalpinen PV-Anlagen der Schweiz: rund **1'600 Modultische** auf ca. 6'400 Mikropfählen, ca. 16'000 Module, über 42 km Werkleitungen. **Euer Job: die Vormontage der Stahl-Primärkonstruktionen am IP Tal 1 in Sedrun.**

Eure Ansprechpartner	Name / Nummer
Werksmeister Stahlbau (Tagesziele, Fachfragen)	Mike Berndt
Bauführer	Victor Malt · 076 835 21 75
Polier	Samuel Decurtins
Qualitätsmanagement	Christopher Zimmermann
Arbeitssicherheit (SIBE)	Sascha Gäumann · 076 833 08 66
STRABAG NalpSolar Hotline	076 312 03 77

1.1 Der Modultisch – und wo S1, S2, S3, S4 sind

NALPSOLAR

Nomenklatur - Ausgangslage

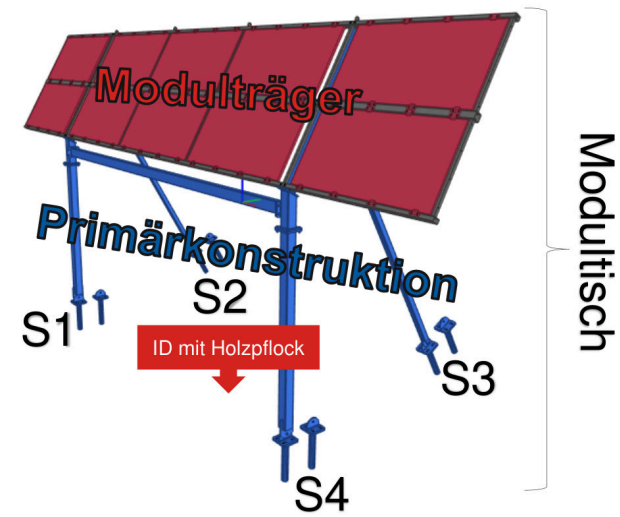

Typ Primaerk.	Farbe	Beschreibung
A2025	Blau	
B2025	Rot	
D2025	Grün	
E2025	Gelb	
A	Blau-Weiss	2026
B	Rot-Weiss	2026
C	?-Weiss	2026
D	Grün-Weiss	2026
E	Gelb-Weiss	2026
A_KF_2025	Blau-Weiss	Bis Fussplatte 2025, Primaerkonstruktion 2026
B_KF_2025	Rot-Weiss	
D_KF_2025	Grün-Weiss	
E_KF_2025	Gelb-Weiss	

4 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Nomenklatur: Modulträger + Primärkonstruktion = Modultisch; Pfähle S1–S4; ID mit Holzpflock in Tischmitte; Typenfarben. (Einführungsveranstaltung 2026, Folie 4)

Merken: Jeder Tisch steht auf 4 Mikropfählen S1–S4 (Lage siehe Bild oben). Jedes **Passtück** ist eine Einzelanfertigung und gehört zu **genau einem Pfahl genau eines Tisches** (Beschriftung Tisch-ID + Position, z. B. «493-S2»). Nie tauschen! Die **Tisch-ID** steht auf dem Holzpflock in Tischmitte und auf allen Teilen und Listen – immer mit ID arbeiten und rapportieren. Typenfarben: A = blau · B = rot · D = grün · E = gelb; 2026er-Typen mit weissem Strich.

1.2 Was ist was am Tisch

NALPSOLAR

Ausgangslage

Alpine Photovoltaikanlage mit Individuallösungen

Wir errichten in Nalps die alpine Photovoltaikanlage NalpSolar. Jede Primaerkonstruktion ist eine dem Gelände angepasste Individuallösung. Jeder Modulträger trägt eine ID.

- Rund 12% sind fertiggestellt
- 2026/2027 Leistungssteigerung
- Viele repetitive Prozesse
- 4 Passstücke je Primaerkonstruktion → Sorgfältiges Arbeiten aller Mitarbeiter
- Drehmomente bis 1500 Nm → Qualitätsmanagement


Verfügbare Hebeegeräte

LTM1060 Pneukran

Teleskopklader

Hebebühnen

→ gestellt durch STRABAG

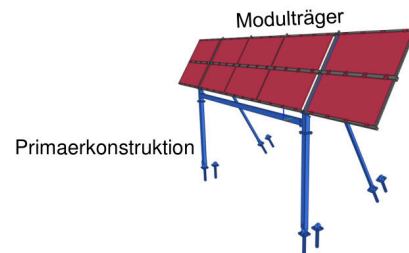

Modulträger + Primaerkonstruktion = Modultisch



STRABAG
WORK ON PROGRESS


2 | 15.01.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

Begriffe und Ausgangslage: 4 Passstücke je Primärkonstruktion, Drehmomente bis 1'500 Nm, Hebeegeräte LTM1060/Teleskopklader/Hebebühnen. (Vorstellung Stahlbaumontage, Folie 2)

1.3 Standort & Logistikkette Tal → Berg

NALPSOLAR

Standort

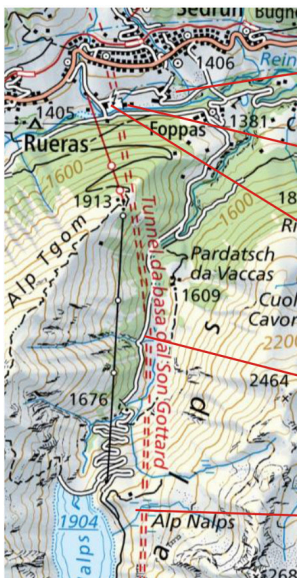



Vormontage
Modulträger durch
CKW

Lieferung der
Stahlbauteile
(Normstücke und
Passstücke)

Vormontage
Knieträger

Transport
Knieträger/Quertra
versen Berg

Baustelle Berg

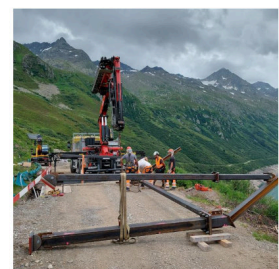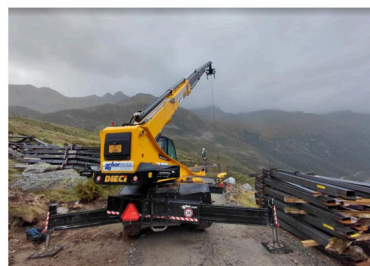

STRABAG
WORK ON PROGRESS

3 | 15.01.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

Vormontage Modulträger durch CKW (IP Tal 4) · Lieferung Stahlteile · Vormontage Knieträger (IP Tal 1 = ihr) · Transport auf den Berg · Baustelle Berg. (Vorstellung Stahlbaumontage, Folie 3)

- Zufahrt Sedrun → Baustelle Berg: ca. 9 km Bergstrasse, ca. 25 Minuten. **Langsam fahren, Gegenverkehr; auf der Baupiste Schrittempo.**
- Jeder Besuch am Berg wird an der **Anwesenheitstafel** erfasst; die Baustelle ist videoüberwacht.

2

Sicherheit



Grundregeln & PSA

Notfall: Alarmierung, Sammelplatz, Heli, AED

PSAgA – Hebebühne & Branach-Leiter

Gefahren dieser Baustelle (Strom, Wetter, Maschinen)

Umwelt (Birkhuhn, Boden, Abfall)

2 · Sicherheit

2.1 Grundregeln – gelten für alle, immer

- **PSA-Tragepflicht ab der ersten Minute:** Helm, hohe Sicherheitsschuhe (S3), Warnkleidung EN 20471, schnittfeste Handschuhe; je nach Arbeit **Schutzbrille + Gehörschutz** (Schlagschrauber!).
- **Wir stoppen die Arbeiten bei Gefahr** – jeder darf und muss STOPP sagen.
- **Keine Alleinarbeit** bei gefährlichen Arbeiten – immer zu zweit.
- **Nie unter schwebenden Lasten.** Nur definierte Anschlagpunkte, geprüfte Anschlagmittel.
- **Baumaschinen haben immer Vortritt** – Blickkontakt mit dem Maschinisten, toter Winkel!
- **Kein Alkohol. Rauchen strikt verboten.** Zigarettenstummel wegwerfen = direkte Verwarnung, ab 3 Verwarnungen Platzverweis.
- Weisungen befolgen, **Mängel und Beinaheunfälle sofort melden.** Baustellensprache ist Deutsch.
- Hebebühne, Branach-Leiter, Stapler, Baumaschinen: **nur mit Ausbildung/separater Unterweisung** bedienen.

Quellen: Übergeordnetes SiKo BE_6010 Rev. A4, S. 8/14–16; PSAG-A-SiKo V1.0 (01.07.2026), S. 13/19; Sicherheitstag 27.05.2026, Folien 12–13; FO 2.1-22 (PSA); Sicherheitskonzept Stahlbau 250318, S. 8.

2.2 Notfall – das musst du wissen

Im Notfall: 1. Ruhe bewahren → 2. Überlegen → 3. Handeln.

Unfall: Absichern & sich selbst schützen → **Alarmieren 144** (Wo? Wer? Was? Wann? Wie viele? Gefahren? Rückrufnummer) → Erste Hilfe → Rettung einweisen. **Immer auch die Bauführung informieren.**

Notrufnummern	
Sanität	144
REGA (Helikopter)	1414
Feuerwehr / Polizei	118 / 117
Europanotruf / Vergiftung	112 / 145

Baustelle / Region	
Bauführer V. Malt	076 835 21 75
STRABAG Hotline	076 312 03 77
SIBE S. Gäumann	076 833 08 66
Arzt Dr. Schnabel / Spital Ilanz	081 949 22 44 / 081 926 51 11

Notfall-Infrastruktur	Wo
Sammelplatz	Berg: IP Berg · Tal: IP Tal 1
Erste Hilfe / Sanitätsraum	Container, oberer Stock (Berg und Tal)
Defibrillator (AED)	Berg: Container, oberer Stock · Tal: Haupteingang Axpo Hydro Surselva / Camping Viva (SiKo zusätzl.: Betriebsgebäude KVR, Eingang Ost) – im Tal-Container ist kein AED!
Heli-Landeplätze Berg	LP 1: 2'701'950 / 1'166'095 · LP 2: 2'701'743 / 1'166'247 (25 m hindernisfrei halten)
Heli-Landeplätze Tal	LP 1: 2'701'551 / 1'170'238 · LP 2: 2'702'535 / 1'170'663 (IP Tal 4)
Rettungsfahrzeug Berg	Gator/UTV mit Rettungsbarre + Erste-Hilfe-Set, ständig am IP Berg
Funk ohne Handyempfang	Zuerst Kraftwerksteuerstelle KVR («KSS», Kanal 4) , dann Zentrale (Kanal 1)

- Gearbeitet wird nur, wenn **mindestens ein Rettungsweg** (Heli oder Strasse) verfügbar ist – bei Schlechtwetter fliegt kein Heli. Zufahrten und Landeplätze immer freihalten; Seilbahn = kein Rettungsweg.
- **Notfallkarte immer dabei haben** – das Notfallkonzept hängt an den Containern Tal + Berg.

2.3 PSAgA – Arbeiten mit Absturzgefahr

- Montagepunkte liegen auf **4.1–6.0 m** → ab 2 m gilt Absturzgefahr. **Kollektivschutz zuerst: Hebebühne** (ca. 90–95 % der Fälle), Leiter nur wenn nötig.
- **Hebebühne:** nur mit Ausbildung (Kat. 3b). Im Korb: **Auffanggurt tragen + am Korb fixiert** («Katapulteffekt»). Nie als Kran missbrauchen.
- **Branach-Leiter:** nur nach separater Unterweisung (zuerst im flachen Gelände). **Nur mit Gurt und am Seil auf die Leiter**. Gegen Kippen/Wegrutschen sichern; 25 kg – zu zweit tragen. Andere Leitern an der Primärkonstruktion sind **verboten**.
- **Keine Alleinarbeit mit PSAgA.** PSAgA kommt vom SIBE und wird jährlich geprüft; Grundkurs PSAgA (min. 1 Tag) nötig.
- **Rettung in max. 20 Minuten:** Branach = Ablassen vom Boden über das integrierte System; Aluleiter = zweite Person steigt hoch und seilt über das PETZL Grillon ab. Wird unterwiesen und geübt.

SiKo PSAgA


Hebebühne

- Bedienung nur mit Ausbildung
- PSA tragen und am Korb fixiert sein (Katapulteffekt)
- Nicht zu nahe an Böschung fahren
- Schäden an Modulen mittels Schaumstoff an Korb vermeiden
- Arbeitsanweisung SiKo



Leiter Branach

- Separate Unterweisung vor Bedienung notwendig
- Nur mit Gurt und am Seil auf die Leiter
- 25 kg – tragen zu zweit
- Nur wenn notwendig
- Anwendung gemäss Unterweisung
- Arbeitsanweisung SiKo

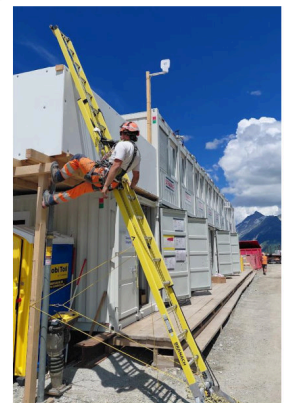

Steilhang: Für die steilsten Hangbereiche ist ein zusätzliches PSAgA-/Rettungskonzept in Arbeit – bis zur Freigabe **keine PSAgA-Arbeiten im Steilhang ohne ausdrückliche Anweisung der Bauführung.**

2.4 Gefahren dieser Baustelle

Gefahren- und Massnahmenanalyse

Gefahren- und Massnahmenanalyse



Unwetter

Evakuierung bei Gewitter
(Sirene beachten)



Arbeiten mit Hörensicherung

Betrifft Leiter und
Hebebühne



Kippen von Fahrzeugen

Schritttempo auf
Baupiste

Langsam fahren auf
Bergstrasse
(Gegenverkehr)



Erschwerte Voraussetzungen
der Erste Hilfe Organisation

Notfallkonzept beachten



Sonne

- Sonnencreme in Aufenthaltsraum
- Nackenschutz immer

19 08.05.2026 NalpSolar

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Die wichtigsten Gefahren hochalpin: Gewitter → Evakuierung (Sirene!), Schritttempo Baupiste, langsam auf der Bergstrasse, Hörensicherung, erschwerte Erste Hilfe, Sonne/UV (Nackenschutz immer). (Einführungsveranstaltung 2026, Folie 19)

Stahlbau Montage Berg

Strom Montage Modulträger

!Gefahr durch Stromschlag!

Bedingung:

- 2025er Modulträger (keine Anschweisbleche)
- Bereits verkabelt durch CKW



Vorsicht beim nachträglichen Festschrauben oder austauschen
Der Befestigungsschrauben!




Gefahr durch herunterfallende Gegenstände

- Strenges einhalten der PSA Tragepflicht



- Modulträger und Primärkonstruktion ordnungsgemäss anschlagen



18 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Stromschlaggefahr: PV-Module liefern Strom, sobald Licht darauf fällt. Vor Arbeiten an verkabelten Modulträgern fragen «Bereits verkabelt?» – GAK (Generatoranschlusskasten) durch CKW ausschalten lassen. Herabfallende Gegenstände: PSA + richtig anschlagen. (Einführungsveranstaltung 2026, Folie 18)

- **Wind:** keine Modulträger-Montage bei starkem Wind/Föhn; Führungsleinen; Stabilisierseil nur lose halten. Wetter täglich checken (AlertSwiss-App).
- **Bergstrasse:** nicht im Konvoi – **100 m Abstand** (Steinschlag-Restgefahr), Hindernisse melden.
- **Stapler IP Tal:** nur mit Ausweis; Fussgängerbereiche respektieren; Ladung mit Zurrgurten + Antirutschmatten sichern.

2.5 Umwelt – Auflagen der Umweltbaubegleitung

Birkhuhnperimeter Umwelt- und Arbeitssicherheit




- Im Birkhuhnperimeter darf erst ab 1. Juli betreten werden
- Die Baupisten darin dürfen befahren werden
- Es darf nicht ausgetiegen werden
- Birkhuhnperimeter wird abgesperrt und Schilder aufgestellt

23 08.05.2026 Nalpsolar **STRABAG** WORK ON PROGRESS

Birkhuhn-Schutzzone: Beschilderung/Absperrung beachten. (Folie 23)

Wassergefährdende Stoffe / Abfall Umwelt- und Arbeitssicherheit

Sostanze inquinanti per l'acqua / rifiuti



24 08.05.2026 Nalpsolar **STRABAG** WORK ON PROGRESS

Wassergefährdende Stoffe + Abfall. (Folie 24)

- **Material immer auf Kanthölzer** legen – nie auf Rasenziegel/Vegetation. Nur Baupisten und freigegebene Flächen befahren.
- **Allen Abfall einsammeln** (auch Kabelbinderreste, Verpackungen, Spraydosen) – die UBB kontrolliert regelmässig.

Quellen: Einführungsveranstaltung 2026, Folien 23–29; Unterweisung Umwelt + AS 04.08.2025; UBB-Begehung 16.07.2026.

2.6 Externes / temporäres Personal

- Vor der ersten Arbeitsaufnahme gibt es diese **dokumentierte Erstunterweisung** (Unterschrift auf dem Nachweisblatt hinten) – gesetzliche Pflicht, während der Arbeitszeit.
- Bei Anstellung über einen Verleiher zusätzlich: Formular FO 2.1-22, **Kopie des persönlichen Sicherheitspasses** und Kontrolle der Ausweise (Stapler, Hebebühne ...).
- Monatliche Sicherheitsthemen und Toolbox-Besprechungen sind Pflichttermine.

Quellen: FO 2.1-22 Instruktion temporäre Arbeitskräfte; AA 2.4-01 Ziff. 5.5.12–5.5.16; SUVA 88821.d (VUV Art. 6).

3

Vormontage

Euer Auftrag & der Ablauf am IP Tal 1

Abstecken, Pfähle S1–S4 im Feld

Euer Typ E: Schrauben & Anziehdrehmomente

Stellreihenfolge & Kabelbinder-Regel

Qualität vor dem Verlad

3 · Vormontage Primärkonstruktion – IP Tal 1


Euer Auftrag: Die Primärkonstruktionen kommen in Einzelteilen von Mauchle Stahlbau und werden am IP Tal 1 **auf Bodenhöhe** vormontiert («Knieträger»). Grundsatz: **So viel wie möglich im Tal vormontieren** – alle Schrauben stecken schon in den Knieträgern, Fussplatten sind angebaut (**Laschen der Fussplatte immer nach INNEN**). «Mehraufwand im Tal, dafür weniger Chaos am Berg.»

3.1 Ablauf am IP Tal 1

1. **Anlieferung** per LKW (Mauchle) inkl. Passstücke – Lieferschein prüfen und in die Sammelbox der Bauführung.
2. **Abladen + Sortieren** mit dem Stapler, nach **Tisch-ID** geordnet zwischenlagern. Beschriftung der Stützen: Tisch-ID + Länge (z. B. «493-2888»).
3. **Vormontage auf Bodenhöhe** nach Typenplan: Schrauben komplett bestücken, Fussplatten anbauen, **Passstück der richtigen Position S1–S4 zuordnen**, Drehmomente nach Tabelle (3.3).
4. **Verladen** auf Pritschen – nur an den **Ringschrauben/Anschlagpunkten** heben, Kanthölzer 50×50 unterlegen. Transport Berg in 1–2 Fuhren täglich.

NALPSOLAR

Bauablauf 2026 und Technische Neuerungen

Abstecken	Bohren & Injizieren
• Absteckung erfolgt mit der Totalstation. • Talseitiger Bohrpunkt liegt direkt in der definierten Ebene. • Bergseitiger Bohrpunkt ist der Schnittpunkt zwischen Vektor und Ebene. • Eine separate Berechnung des bergseitigen Bohrpunkts entfällt. • Beide Punkte werden mit Eisen markiert. • Talseitig Kennzeichnung in Blau, bergseitig in Pink. • Die ID ist mittig des Modultischs zu markieren.	• 2 Bohrteams 1 Injektionsteam • Bohrleistung höher wie Stahlbauleistung • Pfahlkopfplatten werden im Tal vormontiert • Zeitspanne zw. Bohren und Injizieren so kurz wie möglich halten • Pfahllagen in der Baupiste werden vordefiniert
	
	

STRABAG
WORK ON PROGRESS

6 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

So sieht es im Feld aus: Bohrpunkte **talseitig BLAU**, **bergseitig PINK** markiert, Tisch-ID mittig am Holzpflock, Pfähle S1–S4. (Einführungsveranstaltung 2026, Folie 6)

Bauablauf 2026 und Technische Neuerungen

Montage Primaerkonstruktion	Montage Modulträger
• Neue Typen im 2026, Weiterhin aber A B C D E • Typenfarben gleich aber mit Weissen Strich markiert • Blau = A, Rot = B, Grün = D, Gelb = E • Neu 4 Passstücke je Konstruktion • So viel wie möglich wird im Tal vormontiert • Alle Schrauben schon in den Knieträgern • Fussplatten schon an den Knieträgern • Mehraufwand im Tal dafür weniger Chaos am Berg	• Neu nur noch 3 Typen an Modulträgern • Einfachere Montage durch Einrastdorne und Anschweisbleche • Weiterhin Lieferung auf Pritschen a 10 Stück in vordefinierter Reihenfolge (V,V,I,I,V,X,V...) • Mittige Ringösen fallen weg (Schlingen) • Montage primaer mit Hebebühne, sonst Leiter • Gesamte Montage mit voll ausgelastetem LTM1060




7 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Montage Primärkonstruktion + Modulträger, Neuerungen 2026: 4 Passstücke je Konstruktion, Schrauben/Fussplatten ab Tal, Modulträger auf Pritschen à 10 Stück. (Einführungsveranstaltung 2026, Folie 7)

Vorgehen Berg Stahlbaugruppe

- Im Vorhinein durch andere Gruppen: Pfahlkopfplatten montiert
- Stahlbaugruppe nimmt Lieferung Knieträger/Quertraversen entgegen
- Hebegerät wird durch uns bereitgestellt
- Montage der Primaerkonstruktionen an den vorgesehenen Standorten
- Es wird so viel wie möglich im Tal vormontiert




5 | 15.01.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025



STRABAG
WORK ON PROGRESS

Zur Einordnung: So arbeitet die Stahlbaugruppe am Berg mit euren vormontierten Teilen weiter. (Vorstellung Stahlbaumontage, Folie 5)

Typenblatt Typ E: rot = Montage auf dem Berg, gelb markiert = Kontermutter-Verbindungen, mit Nm-Werten je Verbindung. Hängt zusätzlich laminiert am Vormontageplatz. (Drehmomente.pdf, Blatt Typ E)

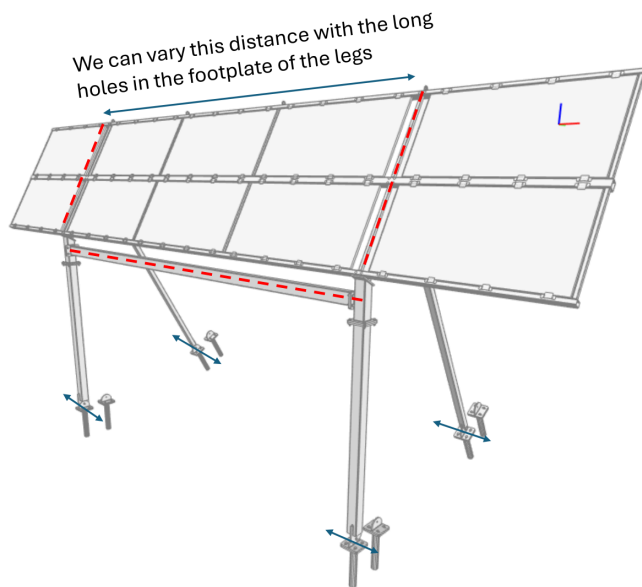

1. The legs in the mountain will be placed first
2. Then the legs in the valey will be placed second
3. Screws of the footplates will be placed and secured **but not tightened**
4. Then the modules will be placed. The Upper U (red dashed) can be varied by moving the footplates
5. When the modules are fixed and screwed we can tighten the footplates of the primary construction




Stellreihenfolge (fürs Berg-Team, müsst ihr kennen): 1. bergseitige Beine · 2. talseitige Beine · 3. Fussplattenschrauben setzen + sichern, **NICHT anziehen** · 4. Module setzen · 5. erst nach Modul-Fixierung Fussplatten anziehen. Laschen der Fussplatte immer innen. (Drehmomente.pdf, S. 5)

Removing zipties during placement of modules

It has a pull cord along the centre purlin of the modules. This is fixed with cable ties so that it is not damaged when the modules are installed. As soon as the module supports are screwed together, the cable ties (green circle) must be cut.

Lungo l'arcareccio centrale dei moduli è presente una corda di trazione. Questo è fissato con fascette in modo da non essere danneggiato durante l'installazione dei moduli. Non appena i supporti dei moduli vengono avvitati, le fascette (cerchio verde) devono essere tagliate.

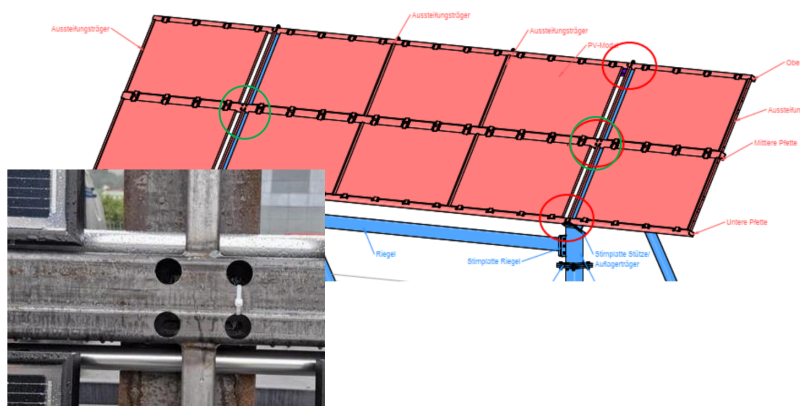

Cut the zipties after the 4 screws have been tightened



Dont cut this rope ;-)

Kabelbinder-Regel: Das Zugseil an der Mittelpfette ist mit Kabelbinder fixiert – nach dem Anziehen der 4 Schrauben Kabelbinder schneiden, **das Zugseil selbst NIE schneiden**. Reste einsammeln (UBB). (Drehmomente.pdf, S. 6)

3.4 Qualität – bevor etwas auf den Berg geht

- **100 % vor Verlad:** vollständig, massgerecht, nach Werkstattplan (Kontrollplan Nr. 43/44 – «Protokoll Vormontage»).
- **Alle Schrauben:** Drehmoment nach Tabelle, Kontermuttern gesichert (Nr. 45/76); Drehmoment-Doku ans QM (Chris Zimmermann).
- **Nur Passstücke aus freigegebenen Batches** verbauen – alte/aussortierte nie; fehlt etwas → Tisch zurückstellen, melden.
- **Auffälligkeiten sofort melden** (falsche Stützenlängen, Beschichtungsschäden, fehlende Teile) – nichts «passend machen».
- Tagesleistung mit **Tisch-IDs** ins Baujournal Stahlbau; bei Stapel-Transporten immer die **Stapel-Nr.** rapportieren. Nie unter oder auf Modulträger-Stapel klettern (max. 15 übereinander, «Lebensgefahr»-Schilder).

Quellen: Kontrollplan 2-3000_B8-13 Rev. 1.0, Nr. 43–45/70/75/76; ILF-Montagekonzept BE_0300 Kap. 3; Verantwortungsmatrix 20.07.2026; Baujournal-Vorlage 08.07.2026.

4

Bauablauf



Aktueller Stand der Baustelle (KW31)

Euer Einsatz: Bereich 26_2.2 (30 Tische, Typ E)

Terminkette & Bereichskarte

4 · Bauablauf – Stand KW31 (28.07.2026)

4.1 Wo steht die Baustelle

Gewerk	Stand 28.07.2026
Stahlbau	Bereich 26_2.1 am 28.07. gestartet (15 Tische); 26_2.2 steht als Nächstes an
Bohren (Geowork)	26_1.6 wird abgeschlossen (gelber Menzi Muck), roter Muck bohrt in 26_5.1; danach 5.2 → 5.4 → 6.1/6.2
Werkleitungen / Feinverteilung	Strang C, Abschnitt C4 in Arbeit; Ziel: in KW32 gesamthaft fertig
Elektro (CKW)	Verkabelung läuft; Prioritäten bis Tisch 1623/1620 (Stapel 37) erledigt
Pneukran LTM 1060	Stillstand (Defekt seit 28.07., Mechaniker aufgeboten)

Quellen: Protokoll Koordinationssitzung 28.07.2026; 5W-Programm KW31–34 (Website-Fassung 28.07.); bauablauf.json.

4.2 Euer Einsatz: Vormontage Bereich 26_2.2

Bereich 26_2.2	Fakten
Umfang	30 Modultische – ausschliesslich Typ E (20× E_KF2025 · 10× E)
Tisch-IDs	292–301, 303–306, 311, 312, 318–321, 328, 329, 330, 348, 349, 350, 369, 370, 371, 2141
Vormontage-Stand	0 von 30 vormontiert – ihr beginnt bei Null (Datenstand 24.07.)
Modulträger-Stapel	Stapel 47 (10 Tische) · 46 (10) · 45 (7, geteilt mit 26_1.5) · 57 (3: IDs 292, 293, 297)
Passstücke	Alle 30 Tische «bestellt», noch keines geliefert – Batch 8 (100 Stk.) neu avisiert Mi 29.07. ; einzelne Rest-Passstücke erst mit Batch 9 (Termin offen)

Voraussetzung für den Start: Passstücke aus **Batch 8**. Eingang prüfen (Lieferschein!), nach Tisch-ID und Position S1–S4 sortieren, der richtigen Konstruktion zuordnen. Tische mit unvollständigem Satz zurückstellen, **nie mit fremden Stücken auffüllen**. Bis alles da ist, gibt Mike Ausweicarbeiten vor (z. B. Restarbeiten 26_2.1).

Besonderheit 26_2.2 – Pfahlköpfe (betrifft die Berg-Montage): Viele Pfahlkopfplatten sind noch nicht montiert (Gewinde-Nacharbeit nötig). Für euch im Tal: **vormontieren nach Plan weiter** – der Takt «Stellen am Berg» kann sich verschieben. Tagesziele kommen von Mike.

Quellen: Nalpi-Exporte 22./24.07.2026; Abstimmungssitzung 47 (20.07., Batch-Liste); Lieferavis Mäder 24.07.2026; Protokoll Koordinationssitzung 28.07.2026.


4.3 Terminkette (Stand 28.07.2026)

Termin	Was passiert
Do 30.07.	Einsatzbeginn Leo + Dennis (07:00, IP Tal 1) · Stapel 36 + 37 auf den Berg (zuerst 36er → 26_2.1)
Do 30.07. – Di 04.08.	Ersatzteam (Jorge, Chris, Bowie, Leo, Dennis) arbeitet 26_2.1 / 26_2.2 – Stammteam Ferien bis Mi 05.08.
Fr 31.07.	Neues Gesamtbauprogramm kommt – Termine danach ggf. neu
Mi 05.08.	Ziel gem. Stand 28.07.: 26_2.1 + 2.2 fertig / Übergabe an Stammteam
Ab Do 06.08.	Fixtermin: 8 Tische mit geänderten Höhen in 26_1.1/1.2/1.3
17.08. – 21.08.	Stapel 46 + 47 (Modulträger 2.2) auf den Berg

Grundregel Takt: Die Vormontage muss dem Stellen am Berg immer **1–2 Tage voraus** sein. Fehlen Teile (Passstücke, Schrauben, Kleinteile) → **sofort melden**, nicht erst am Abend.

Quellen: bauablauf.json / 5W-Programm Stand 28.07.2026; Protokoll Koordinationssitzung 28.07.2026. Der ältere 5W-Stand (20.07.) führte 2.2 bis in KW33+; massgebend sind Mikes Tagesziele + das neue Gesamtbauprogramm ab 31.07.

4.4 Bereichskarte Baujahr 2026

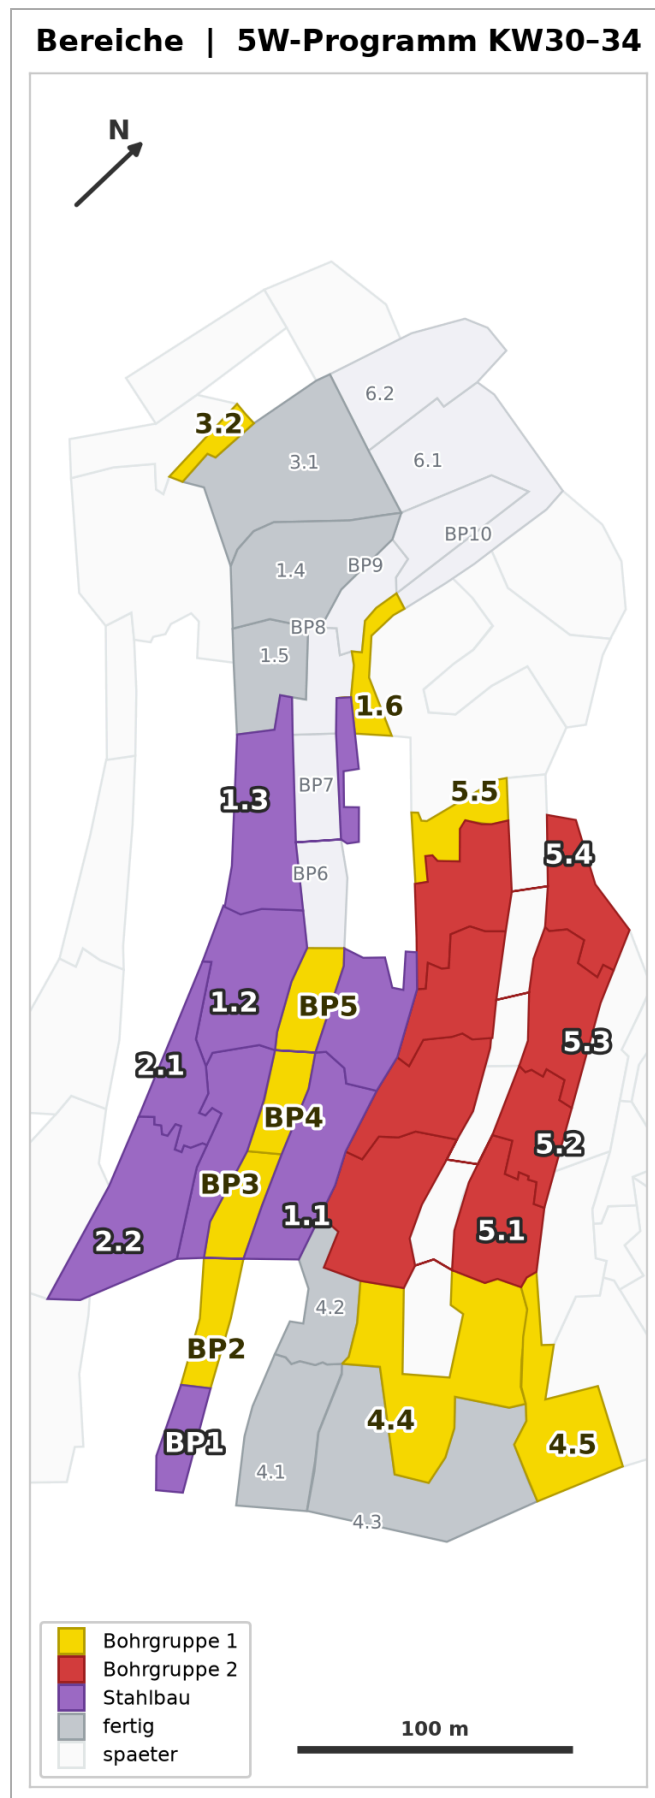

Quelle: Bereichskarte 5W-Programm (23.07.2026).

Unterweisungsnachweis

Baustelle: NalpSolar, Los B8-13, Cuolm Nalps / Sedrun (GR) · **Ort der Unterweisung:** IP Tal 1, Sedrun ·
Datum: _____

Unterwiesene Themen (Zutreffendes abhaken)

✓	Thema
☐	Register 1 – Projekt, Ansprechpartner, Modultisch & Pfähle S1–S4, Tisch-IDs, Logistikkette
☐	Register 2 – Grundregeln & PSA-Tragepflicht
☐	Register 2 – Notfall: Alarmierung, Nummern, Sammelplatz, AED-Standorte, Heli-Landeplätze, Funk
☐	Register 2 – PSAG A: Hebebühne / Branach-Leiter (je nur mit Ausbildung/separater Unterweisung), Rettung
☐	Register 2 – Gefahren: Gewitter/Sirene, Wind, Sonne, Stromschlag/GAK, Maschinen, Fahrverhalten
☐	Register 2 – Umwelt: Birkhuhn, Bodenschutz/Kanthölzer, Abfall (Verwarnungen), Stoffe
☐	Register 3 – Vormontage: Ablauf, Anschlagen/Heben, Drehmomente + Kontermutter-Ausnahmen, Passstück-Regeln, Qualität
☐	Register 4 – Bauablauf, Bereich 26_2.2, Tagesziele & Meldewege
☐	Notfallkarte abgegeben («Notfallkarten immer dabei haben!»)

Unterwiesene Personen

Mit der Unterschrift bestätige ich, die Unterweisung verstanden zu haben und die Regeln einzuhalten. Fragen wurden beantwortet.

Name, Vorname	Firma	Hebebühnen-Ausweis?	E-Mail / Tel.	Unterschrift
		☐ ja ☐ nein		
		☐ ja ☐ nein		
		☐ ja ☐ nein		
		☐ ja ☐ nein		

Unterweisung durchgeführt durch

Name, Funktion	Datum	Unterschrift

Original zur Ablage SGU (Dropbox 04 Projekt-Q-mangement\06 SGU\05 Instruktion-Unterweisung\), Kopie ins Baubüro. Separat zu dokumentieren, falls zutreffend: Unterweisung Hebebühne, Unterweisung Leiter Branach (je eigene Nachweise).
