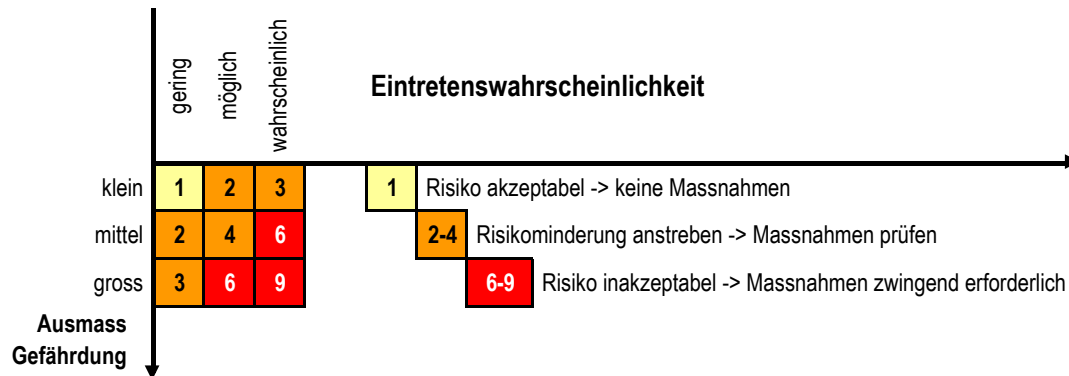


**Vorgehensschritte**

1. Gefahren die auf das Projekt zutreffen auswählen
(Durch Einfügen des Buchstabens "x" in Spalte B)
2. Ergänzungen und Änderungen sind möglich durch das Überschreiben nicht benötigter Gefahren
3. Gefährdung einschätzen und bewerten */**
4. Beschreiben der Massnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine
5. Nachweise, Wirkung der Massnahmen dokumentieren
6. Gefahrenbeurteilung dem Baufortschritt entsprechend aktualisieren

Projekt: **NalpSolar, IP Tal 1**Einheit: **MX EE RKDO****Legende zur Bewertung****EW** = Eintretenswahrscheinlichkeit ***A** = Ausmass ****RW** = Risikowert

* die Eintretenswahrscheinlichkeit ist jeweils mit den Werten 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich" anzugeben

** das Ausmass der Gefährdung ist jeweils mit den Werten 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross" anzugeben

Bearbeitungsstatus

Version	erstellt / revidiert		geprüft		freigegeben	
	Datum	Visum	Datum		Datum	Visum
-	02.07.2025	Victor Malt	02.07.2025	François Borner	02.07.2025	François Borner
A	06.05.2026	Victor Malt	07.05.2026	François Borner	07.05.2026	François Borner
B						
C						
D						
E						

123
Entscheide Dich für
Sicherheit

1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung					Phase:	Ausführung				
	Projekt: NalpSolar, IP Tal 1		Einheit: MX EE RKDO			Ersteller/Datum: Victor Malt, 02.07.2025					
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert									Ausdruck vom 15.05.2026	
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung		Gefährdung	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links		Verantwortlich	Termin		
			EW	A	RW	Massnahmen					
	x	1 Nachbarschaft/Öffentlichkeit									
	X	1.1	Lärm	1	2	2	Lärmbelästigung der angrenzenden Wohngebiete durch Metallbau - Grundsätzlich zeigen erste Erfahrungen der Stahlbaumontage auf dem IP Tal dass sie die Lärmbelastung in Grenzen hält. - Durch herunterfallende Metallteile können kurzzeitig sehr hohe Lärmbelastungen auftreten.	Suva Checkliste 67171: Technische Lärmschutzmassnahmen Suva 44057: Gehörgefährdender Lärm am Arbeitsplatz Suva 86048: Akustische Grenz- und Richtwerte Suva Informationsschrift 86044: Lärmdeklaration nach europäischen und schweizerischen Vorschriften			
	x	2 Umgebung/Natur									
	X	2.3	Unwetter, Sturm, Hagel, Dauerregen	1	1	1	Wind, Hagel Grundsätzlich befindet sich der IP Tal 1 an einem relativ geschützten Standort auf einem asphaltierten Platz. Es ist von einer geringen Gefährdung mit geringer Eintretenswahrscheinlichkeit auszugehen.	Suva Fachthema: Arbeitssicherheit bei Naturgefahren Suva Checkliste: Notfallplanung Video, Ribí on Tour: Vom Winde verweht			
	x	4 Personal (eigene/Temporäre/SubU/Lieferanten)									
X	4.1	Unerfahrenheit	2	1	2	Nichterkennen von Gefahren, fehlende Routine Am IP Tal werden Personen eingesetzt welche Erfahrung im Bereich Metallbau und Logistik mit sich bringen. Auf häufigen Personalwechsel wird verzichtet.	Suva Broschüre 88217: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle. Für Personen im temporären Einsatz IQM IRIS CH: FO 2.1-08 CH/Allg. Einführung neuer Mitarbeiter (gewerbl.)				
x	4.2	Fehlende Ausbildung	1	1	1	Nichterkennen von Gefahren, fehlende Routine - systematische Einführung und Schulung der Mitarbeiter	IQM IRIS CH: FO 2.1-22 CH/Allg.Instruktion temporäre Arbeitskräfte Suva Merkblatt 11043: Falsch - richtig: Situationen auf Baustellen				
X	4.3	Fehlende PSA	2	1	2	Nichttragen des PSA - Durchsetzung der Tragepflicht PSA - Bereitstellung der erforderlichen PSA Insbesondere das Tragen von Langen Hosen und Handschuhen ist am IP Tal wichtig. Sichtbarkeit wegen der vielen Anlieferungen und Handschuhe wegen dem Metallbau	Suva PSA : Alles was Sie über PSA wissen müssen				
x	5 Allein arbeitende Personen										
X	5.1	Gefährliche Arbeit	2	2	4	Herunterfallen von Teilen der Primärkonstruktion kann ein einklemmen in die Teile verursachen.. Mit dem Stapler werden die Teile nur auf geringer Höhe transportiert. Ausserdem wird die Primärkonstruktion am Boden zusammengesetzt.	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.				
X	5.2	Fehlende Hilfeleistung nach Unfall	1	1	1	Gesundheit des Verunfallten: Bewusstlosigkeit, Verbluten, Erstickung, Ertrinken, Erfrierung des Verunfallten Ein erste Hilfe Kit ist am IP Tal vorhanden. Es sind immer 2 Personen vor Ort	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.				
x	6 Zugänge/Verkehrswege										
X	6.4	Hindernisse durch herumliegende Gegenstände	3	1	3	Anstossen an Hindernissen Stolpern und Stürzen - Die Bautelie der Primärkonstruktion werden beim IP Tal 1 in klar definierten Bereichen gelagert	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen: BAUSTELLENORDNUNG / BAUSTELLENLOGISTIK, Sichere Zugänge				

1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung										Phase:	Ausführung		
	Projekt: NalpSolar, IP Tal 1					Einheit: MX EE RKDO					Ersteller/Datum: Victor Malt, 02.07.2025			
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert											Ausdruck vom 15.05.2026		
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin					
			EW	A	RW	Massnahmen								
X	6.6	Spitze Gegenstände, Nägel	3	1	3	Schnitt und Stichverletzungen - Tragen von PSA - Aufräumen, 1 mal Wöchentlich mit dem Stapler besen. Der Platz wird jeden Abend sauber verlassen - Entfernen und Abdecken von spitzen Gegenständen	BauAV Art. 10 Entfernung von scharfkantigen und spitzigen Gegenständen							
x	7	Fahrzeugverkehr												
X	7.2	Baustellenzufahrt	1	2	2	Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern, Unfälle - Erstellen einer korrekten Baustellensignalisation - Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in den angrenzenden Orten, insbesondere Surrein	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik BauAV 7. Abschnitt: Transport							
X	7.3	Kollision	2	2	4	Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern - Erstellen getrennter Gehkorridore beim IP Tal 1 - Verwendung von innovativen AI Rückfahrkameras mit Personenerkennung	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik BauAV 7. Abschnitt: Transport							
X	10.3	Arbeiten bei grosser Hitze	3	1	3	Körperliche Überhitzung; Hitzekrämpfe; Hitzeerschöpfung; Hitzeschlag; UV-Strahlung - Wenn möglich, den Arbeitsplatz abschatten - Kopfbedeckung mit Nackenschutz und Stirnblende (Juni-Juli obligatorisch) - Hautschutzcreme - Dunkle Schutzbrillen - Genügend Wasser trinken, keine alkoholischen Getränke	BfA-Info: Schutz gegen Hitzeschläge und UV Strahlung Suva Fachthema: Sonne.Hitze, UV-Strahlen und Ozon www.suva.ch/sonne-faq IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen «Sonnenschutz am Bau» Suva Checkliste 67135: Arbeiten an heissen Tagen auf Baustellen im Freien							
x	15	Manuelle Tätigkeiten												
x	15.1	Bewegen von Lasten	2	2	4	Eingeklemmt bzw. Gequetscht werden. Sich anschlagen, Misstritte, Stolpern, Herunterfallen oder Umkippen von Lasten Schäden an Wirbelsäule, Gelenken, Muskulatur wegen Überlastung - Tragen von PSA	Lastentransport von Hand, EKAS Informationsbroschüre: 6245							
x	15.2	Ziehen und Richten	2	1	2	Herunterfallen oder Umkippen von Lasten Schäden an Wirbelsäule, Gelenken, Muskulatur wegen Überlastung - Achten auf sicheren Stand - sicheres Anpacken von Lasten - nahes Halten der Lasten am Körper - Verwerndung richtiger Hilfsmittel - Tragen von PSA	Suva Sachthemen: Körperliche Belastungen							
x	15.4	Arbeit mit Werkzeugen	1	2	2	Verschiedene Verletzungen Infolge schlechter Werkzeugqualität, unkorrekte Verwendung von Werkzeugen ungenügende Kontrolle und mangelhafter Unterhalt - Einsatz von richtigem Werkzeug, dem Verwendungszweck entsprechend - regelmässiger Unterhalt der Werkzeuge	Suva Merkblatt 44015: Handwerkzeuge Suva Checkliste 67078: Handwerkzeuge							
X	15.5	Beladen von Fahrzeugen	2	2	4	Ausrutschen, Stolpern, Fehltritt, Absturz, Eingeklemmt bzw. Gequetscht werden, überlastung der Wirbelsäule sowie Gelenke und Muskulatur - Einsatz von geeigneten Transportmitteln - Tragen von PSA - Achten auf sicheren Stand - sicheres Anpacken von Lasten - Halten der Last nahe am Körper	Suva Checkliste 67093: Fahrzeuge beladen von Hand							

1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung					Phase:	Ausführung			
	Projekt: NalpSolar, IP Tal 1		Einheit: MX EE RKDO			Ersteller/Datum: Victor Malt, 02.07.2025				
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert								Ausdruck vom 15.05.2026	
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin	
			EW	A	RW					
						- Heben der Lasten mit flachem Rücken bzw. Anheben aus der Hocke - Tragen von schweren und sperrigen Lasten zu Zweit	Richtig laden - Richtig sichern: Lernprogramm ASTAG			
	x	16 Lastentransport mit Baumaschinen								
	x	16.1	Lastentransport Baumaschinen (Pneulader, Stapler etc.)	2	2	4	Fahren ohne Staplerausbildung, Angefahren werden vom Stapler, Kippen bzw. Abstürzen des Staplers Getroffen werden von herabfallenden Lasten - Einsatz von MA mit Staplerausbildung und genauer Instruktion - anhängen an den dafür vorgesehenen Ösen - Lasten (speziell Solarpaneelen), werden mit einem Führungsseil gesichert gegen Wind.	Suva Checkliste 67039: Kleinmaschinen für den Bau		
	x	16.3	Montage von Fertigbauteilen mit Baumaschinen	2	2	4	Herunterfallen oder Kippen der Fertigelemente oder Teile des Modultischs - Einsatz von geeignetem und instruierten Personal - Achten auf tragfähigem Untergrund - sichern von positionierten Bauteilen (Zug- und druckfest) - Verwendung von zum System passenden Anschlagmitteln gemäss Herstellerangaben - Verwendung von Absturzsicherungen mit Kollektivschutz (falls nicht möglich PSAgA)	Suva Instruktionshilfe 88821: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbau-Montage		
	x	16.4	Beladen von Fahrzeugen	2	1	2	Absturz der arbeitenden Personen vom Fahrzeug, Absturz vom Transportgut, Herunterfallen von Lasten, Einklemmt oder gequetscht werden - Achten auf sicheren Stand - richtiges Anschlagen von Lasten - Tragen von Schutzausrüstung (PSA)	Suva Checkliste 67094: Fahrzeuge beladen mit Hebegeräten		
x	16.5	Herunterfallen von Gegenständen	1	3	3	Getroffen werden - nicht unter Lasten stehen - richtiges Anschlagen von Lasten - Tragen von Schutzausrüstung (PSA)	Suva: Anschlagen von Lasten. Lerneinheit 88801			
x	18 Anschlagmittel									
x	18.1	Drahtseile, Hebegurten, Ketten	2	2	4	Von der Last getroffen werden, einsatz zu schwacher/beschädigter oder ungeeigneter Anschlagmittel, Fehler beim Anschlagen der Lasten - Regelmässige Instruktion des Personals	Suva Checkliste 67017: Anschlagmittel,Anbindemittel			
x	18.3	Anschlagen von Lasten	1	3	3	Einklemmen von Personen oder Körperteile beim Anheben und Absenken der Last. Getroffen werden durch Einsatz zu schwacher, beschädigter oder ungeeigneter Anschlagmittel - Ausbildungspflicht für das Anschlagen von Lasten an Kranen - geeignete Anschlagmittel zur verfügung stellen	Suva Factsheet Nr. 33099: Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen			
X	18.4	Ungeprüfte Anschlagmittel	3	1	3	Versagen (Bruch,Riss) - es dürfen nur geprüften Anschlagmitteln verwendet werden	Anschlagmittel müssen jährlich geprüft werden (gem. UVG Art. 81-88 sowie VUV und Art. 32b)			
x	20 Baumaschinen und Geräte									
X	20.1	Tätigkeiten in der Nähe von Baumaschinen	2	1	2	Angefahren (Überfahren) und Getroffen werden - Achten auf toten Winkel - Herstellen Blickkontakt mit Maschinisten - Tragen von PSA - Baumaschinen haben gegenüber "Fussvolk" immer Vortritt (Unterweisen aller Beteiligten) --> Ein Teil der Maschinen wird mit einer innovativen AI Personenerkennung ausgestattet	BfA INFO 51: Sichtfeld bei Baumaschinen Suva Richtlinie 1574: Richtlinien für die Benützung von Erdbewegungsmaschinen und Transportfahrzeugen			

1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung					Phase: Ausführung		Ersteller/Datum: Victor Malt, 02.07.2025		
	Projekt: NalpSolar, IP Tal 1		Einheit: MX EE RKDO							
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert								Ausdruck vom 15.05.2026	
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin	
			EW	A	RW	Massnahmen				
X	20.5	Stapler / Zudiengeräte (Pneulader mit Anbaugerät "Gabelvorrichtung")	1	3	3	Fehlende Ausbildung und Instruktion; Angefahren oder Getroffen werden; Umkippen oder Abstürzen des Staplers; Getroffen werden von einer herabfallenden Last - Bedienen des/der Staplers/Zudiengeräte nur mit gültigem Fahrausweis (Pneulader mit Anbaugerät "Gabelvorrichtung" = schriftliche Unterweisung nötig) - Instruktion des Personals am Arbeitsplatz gemäss Bedienungsanleitung - keine Überlastung des Staplers/Radladers - Bewegung nur mit gesicherten Ladungen - Fahren nur mit abgesenkter Ladung - Rückwärtsfahren bei verdeckter Sicht nach vorn - Entfernen des Fahrzeugschlüssels beim Verlassen des Pneuladers/Staplers	Suva Instruktionsmappe 88830: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern. Instruktionshilfe Suva Checkliste 67021: Gegengewichtstapler Suva Checkliste 67123: Übergabestellen für den Warentransport mit Staplern und Kranen Suva Checkliste 67164:Seiten- und Vierwegstapler Suva Checkliste 67094: Fahrzeuge beladen mit Hebegeräten Suva Checkliste 67046: Deichselstapler			
x	30	Weitere Informationsquelle/Links HSW			40	Erforderliche Ausbidkungen nach Art. 8 VUV				
x	30.1	Neue Bauarbeitenverordnung (BauAV) 2022				Bedienung von Fahrzeug und Turmdrehkranen	Führen von Staplern			
x	30.2	Häufige Fragen und Antworten zur neuen Bauarbeitenverordnung (FAQ)				Bedienung von Lastwagenkranen				
x	30.3	www.suva.ch/bau				Montage, Demontage und Instanhaltung Kranen				
x	30.4	BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Anschlagen von Lasten				
x	30.5	Wegleitung EKAS				Führen von Baumaschinen				
x	30.6	www.absturzsisko.ch				Bedienung von Betonpumpen				
x	30.7	holzbauvital				Hubarbeitsbühnen bedienen				
x	30.8	Leitfaden BauAV im Holzbau Version 4.0				Arbeiten mit der Kettensäge (Motorsäge)				
x	30.9	K-BMF Gerätekategorie mit Fotos				Mit Sprengstoff arbeiten				
x	30.95	Gesetzliche Grundlagen: BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Mit Anseilschutz arbeiten / Arbeiten am hängenden Seil				
