5-Wochenprogramm

03.08.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug

Woche	Datum	Tag
Woche 32	03.08	Mo
	04.08	Di
	05.08	Mi
	06.08	Do
	07.08	Fr
	08.08	Sa
	09.08	So
Woche 33	10.08	Mo
	11.08	Di
	12.08	Mi
	13.08	Do
	14.08	Fr
	15.08	Sa
	16.08	So
Woche 34	17.08	Mo
	18.08	Di
	19.08	Mi
	20.08	Do
	21.08	Fr
	22.08	Sa
	23.08	So
Woche 35	24.08	Mo
	25.08	Di
	26.08	Mi
	27.08	Do
	28.08	Fr
	29.08	Sa
	30.08	So
Woche 36	31.08	Mo
	01.09	Di
	02.09	Mi
	03.09	Do
	04.09	Fr
	05.09	Sa
	06.09	So

V N V N V N V N V N V N V N

1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend (roter Muk + Euromac) | Reihenfolge gemaess Gesamtbauprogramm 03.08. (F. Borner)

Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_3 / B_4 - vor Bohrstart, erst NACH Tablet-Neuexport!
SOLL-Konflikt 26_5.3 GEKLAERT (Nalpi=A2 korrekt): Tablet-Neuexport alte A6-Hoehe X

Bohren 26_4.3 + 4.4 REST (gelber Muk + Euromac) - FERTIG bis Fr 07.08. (Sitzung 04.08.)
danach DIREKT Bohren 26_5.1 Rest (Sitzung 04.08.) - Alpwuestungen NUR mit ADG-Begleitung!
Bohren 26_5.3 REST (41 T. total) - roter Muk - fertig bis Do 06.08. (GBP)
Bohren 26_5.4 (31 T.) - Fr 07.08. bis Di 11.08. (GBP)
Bohren 26_5.5 (6 T.) - Mi 12.08. bis Fr 14.08. (GBP)
Bohren 27_8.1 (29 T.) Mo-Do | BP_B_3 Do/Fr 20./21.08. | 27_8.2 (10 T.) Fr 21.-Mo 24.08. (GBP)
Bohren 27_8.3 (8 T.) Di/Mi 25./26.08. -> danach 26_6.1 (27 T.) Do 27.08.-Do 03.09. (GBP)
Bohren 26_6.2 (13 T.) + BP_B_4 ab Fr 04.09. (GBP)
ACHTUNG Sitzung 04.08.: 'danach 6.1/6.2, SPAETER 8' vs. GBP (8.x zuerst) -> Reih X
Bohren unter der Strasse - nach Bereich 8 (Sitzung 04.08., ausserhalb Fenster)

INJEKTION laufend (Nachlauf ~2 Tage) - Gruppe muss VIEL sauberer arbeiten (UBB!)
Leistung Bohren stimmt | rund um Injektionspunkte sauber gemaess UBB (Sitzung 04.08.)
CKW-Kran Fiore am Berg - 3 Wochen inkl. KW32 (bis Fr 21.08., Sitzung 04.08.)

2) STAHLBAU

Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 9 (4.1) GELIEFERT Di 04.08. | Batch 10 Liefertermin nachhaken X
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) + Batch 13 (Baupiste B, best. 27.07.) - Liefertermin X
Batch 12 Stahlbau - MUSS bis Mo 17.08. da sein (nachfassen Mi 12.08.) X X
Batch 14 (Baupiste B4/B5, best. 04.08.) - Liefertermin nachhaken X
Freigabebatch 15 (Tische 202 + 1596, neue Typen) bei ILF - Freigabe nachfassen X
Schrauben Bestellbatch 3 (best. 03.08.) - Liefertermin Maeder offen -> nachfassen X
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_2.2 fertigstellen bis Fr 07.08. (ohne Batch-9+10-Tische)
Nacharbeit 26_2.2: Batch-9+10-Tische montieren
26_4.1 (24 T.) - Do 13.08. bis Fr 21.08. (GBP; Batch 9 da, Batch 12 bis 17.08. noetig!)
BP_B_2 geaenderte A8-Daten - Mo/Di 17./18.08. (GBP)
26_4.2 (13 T.) - Mo 24.08. bis Mi 02.09. (GBP)
BP_B_3 Di/Mi 01./02.09. + Fertigstellung A8-Baustopp-Tische Do/Fr 03./04.09. (GBP)

Baustopp-/A8-Tische (8 T. falsche Hoehen 1.1-1.3, BP B2 u.a.): gemaess GBP 17./18.08. + 03./04.09. (Zeilen oben)

Pfahlkopfplatten
26_2.2 PFAHLKOPF-FIASKO: passende Koepfe mit 5.0-Gewinde SOFORT suchen + montieren (neue Koepfe / alte Pfaehle)
Inventur Gewinde - KRISTJAN verantwortlich (Basis pfahlkopf.html) X
Nachschneidemaschine Gewinde organisieren (Mike) | Kontakt Terno laeuft X
Platten uebrige Bereiche nach Injektion (4.3 / 4.4 / 4.5 -> 5.x, Nachlauf)

Modultraeger / Stapel
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2 (Rest) | weitere gemaess Logistik-App
Stapel -> 26_4.1 (ab Do 13.08.)
Stapel -> 26_4.2 (ab Mo 24.08.)

3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG - ABSCHLUSS Strang C
IST Di 04.08.: C2-C5 abwaerts FERTIG | C3 aufwaerts ausgehoben, Di Abend zu
Mi 05.08.: C5 oben (C4 frisch injiziert) - danach FV-ABSCHLUSS + Restarbeiten
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - komplett VOR Noel-Abreise 26.08.
Strang NICHT auf dem Geraet (Topcon/GPS) -> VICTOR abklaeren (Sitzung 04.08.) X

Schacht D1: Aushub FERTIG, Schacht VERSETZT (Stand 04.08.)
Schacht D1 Anschluesse / Fertigstellung AB KW33 - PLAENE NOETIG -> bei ILF nac X

GAK C1.1 (Mauderli): Schachtliste fehlt weiterhin - nachfassen X
Baupiste D FERTIG Di 04.08. Abend
Wetterstation: Kalibrierung fertigstellen / Loch oeffnen SOBALD entlang C fertig gebohrt (ca. KW36)
Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C) - Fr 04.09. bis Mo 07.09. (GBP)
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)
UEBERTRAG KW31: Altlasten-Anker ausgraben/abtrennen + Bereiche Zug-/Ausziehversuche instandstellen - Stand pruefen X

4) ERDBAU / FUNDAMENTE

Deponie / Baustellenordnung dauerhaft halten - 'heute war gut, weiter so' (Sitzung 04.08.)
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
Scheibe Manitou ersetzen - Frist 'bis Montag' (Protokoll nennt 05.08. -> Mo 10.08. angenommen) X
Grasnarben-Problematik beim Bohren MUSS besser werden (UBB)
Konzept Foehn (Victor) - ERLEDIGT 05.08.: Foehnwaechter SCHARF + SGU-Paket 2 X
Injektionsgruppe: Sauberkeit rund um Injektionspunkte (UBB) - Kontrolle laufend
Maengelmanagement aufraeumen (Sitzung 04.08.) X
ADG-Begleitung Alpwuestungen 26_5.1 - Termin VOR Bohrstart KW33 fixieren! X
Gewaesserraum 5.5 m (ILF) fuer weitere Baupisten | Birkhuhnperimeter beachten

Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen | KSR DN60 Lager zaehlen | Baupisten PZ4 pruefen

Woche	Personalbedarf (inkl. Polier)	Bemerkungen
Woche 32	22 22 22 22 22 0 0	IST Di 04.08.: 2.2 bis Fr fertig (ohne Batch 9+10) Bohren: 4.3/4.4 bis Fr fertig | 5.3 -> 5.4 FV Strang C Abschluss | Baupiste D + Schacht D1 versetzt
Woche 33	22 22 22 22 22 0 0	Bohren: 5.4 -> 5.5 | gelb in 5.1 (ADG!) Stahlbau: Nacharbeit 2.2, ab Do 13.08. 26_4.1 Schacht D1 Anschluesse (PLAENE noetig!)
Woche 34	22 22 22 22 22 0 0	Bohren 27_8.1 -> BP_B_3 -> 27_8.2 (GBP) Stahlbau 4.1 fertig + BP_B_2 A8-Daten Batch 12 muss da sein (17.08.) | Fiore letzte Woche Berg Pizzaessen Fr 21.08.
Woche 35	22 22 22 22 22 0 0	Bohren 27_8.3 -> 26_6.1 (ab Do 27.08.) Stahlbau 26_4.2 Noel bis Mi 26.08.
Woche 36	22 22 22 22 22 0 0	Bohren 6.1 fertig -> 6.2 + BP_B_4 (ab Fr 04.09.) Rueckbau Baupiste Strang C 04.-07.09. Stahlbau BP_B_3 + A8-Baustopp-Tische Wetterstation Kalibrierung

PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Sitzung 04.08.)
Polier: Samuel Decurtins \| QM/Vermessung: Chris Zimmermann, Kristjan Loevisunda, Richard (Geoworks), Noel (bis 26.08.)
Stahlbau Tal: Luis + Marco Busigel - Ferien bis Mi 05.08.
Stahlbau Berg: Fabian + Adrian Schaefer \| Przemyslaw Modrak Ferien bis Mi 05.08.
Ersatz Stahlbau (bis Stammteams zurueck): Jorge, Chris, Bowie, Dennis + Leo - 5 Tische/Tag halten
IP4: Fiore Salvatore - 3 Wochen am Berg inkl. KW32 (bis ~21.08.)
Tiefbau: Fabian Bissig (Samuel ueberlegt noch) \| Fiore + ??? \| RETO FAELLT AUS -> X
Luka - Ferien 2 Wochen (bis ~14.08.)
Alexander - Ferien 2 Wochen (bis ~14.08.)
Noel (Vermessung) bis Mi 26.08. vor Ort - Doku FV + Aufnahmen vorziehen
-> nach Rueckkehr Stammteams Do 06.08.: 2 Ersatzleute bleiben fuer Stahlbau-Feinschliff (gem. KW31-Plan)
Notiz: _____

5-Wochenprogramm

20.07.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug

Woche	Datum	Tag
30	20.07	Mo
	21.07	Di
	22.07	Mi
	23.07	Do
	24.07	Fr
	25.07	Sa
	26.07	So
31	27.07	Mo
	28.07	Di
	29.07	Mi
	30.07	Do
	31.07	Fr
	01.08	Sa
	02.08	So
32	03.08	Mo
	04.08	Di
	05.08	Mi
	06.08	Do
	07.08	Fr
	08.08	Sa
	09.08	So
33	10.08	Mo
	11.08	Di
	12.08	Mi
	13.08	Do
	14.08	Fr
	15.08	Sa
	16.08	So
34	17.08	Mo
	18.08	Di
	19.08	Mi
	20.08	Do
	21.08	Fr
	22.08	Sa
	23.08	So

V N

1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk

Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10

26_4.3 GEBOHRT - Pfaehle einsetzen (Roter Kran, Boei)
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - ab Mi 22.07. roter Muk, weiter oben
Bohren 26_1.6 (25 Stz) - gelber Muk HEUTE runter (Mi 22.07.)
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - Mo-Di roter Muk, Rest gelber Muk
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwuestungen (76 Stz) G2
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35
INJEKTION 26_4.3 / 4.4 / 5.1 - Material Mo vorbereitet, Start Di 21.07.
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten
CKW-Kran Fiore ab KW31 HOCH (Berg) - CKW stoppt IP Tal 4

2) STAHLBAU

Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07. — X (Mo 27.07.)
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten — X (Mi 05.08.)
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag) — X (Sa 01.08.)
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein — X (Mo 17.08.)

Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert!)
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW
PZ2025 PRIO 3 (1623, ...) -> CKW
26_2.1 + 26_2.2 (49 Tische | Ziel 25 Tische/Woche = 5/Tag) ab Di 28.07.
STAMMTEAM FREI (Ersatzteam uebernimmt, 5 Tische/Tag halten)
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - 5 Tische/Tag
26_2.1 + 26_2.2 fertigstellen (49 T. total) -> ~Mo 10.08.
danach: 8 Tische falsche Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3
danach: Baupiste B2 (9 T.) - ACHTUNG Passstuecke Batch 12 erst 17.08.!
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da
Stapel 36 -> 26_2.1 folgt | Reserve: Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht

Pfahlkopfplatten
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)

Modultraeger / Stapel
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1
Stapel 45 -> 26_2.1 (letzte Traeger heute Mi, Stapel Do 23.07. frueh runter)
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2

3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31!)
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrflaeche frei)
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)
FV Strang C: C3 / C2 unten
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil
Graben bis Schacht D1 fertigstellen
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten — X? (Do 30.07.)
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung) — X (Do 30.07.)
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)

Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)

4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.!)
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)
Ausschalen + Material wegraeumen
Deponie raeumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<

5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig) — X (Mo 20.07.)
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszaeunen (fertig Di abend)
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07. — X (Do 30.07.)
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08. — X (Do 04.08.)
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27.-31.07.) — X (Mo 20.07.)
Gewaesserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen | KSR DN60 Lager zaehlen | Baupisten PZ4 pruefen

Woche	30	31	32	33	34
Personalbedarf (inkl. Polier)	22 22 22 22 22 0 0	22 22 22 22 22 0 0	22 22 22 22 22 0 0	22 22 22 22 22 0 0	22 22 22 22 22 0 0
Bemerkungen	Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi) Fabian Bissig Ferien KW30+31 | Reto Poehl krank Ias Rueras gesperrt bis 24.07. Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt -> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07.	Stahlbau-STAMMteam frei Do 30.07. - Di 04.08. -> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch (Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!) Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08.	Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Alexander Ferien 03.-14.08. | Luka Ferien Stahlbau 2.1+2.2 (49 T.) fertig ~Mo 10.08. (Ziel 25 Tische/Woche = 5/Tag),	Alexander + Luka Ferien Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli	Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter 26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35

PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Ersatz + Zusatz - Namen hier eintragen)

Alexander - FERIEN 2 Wochen (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Alexander (Feinverteilung): _____

Luka - FERIEN 4 Tage (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Luka (Feinverteilung): _____

Zusatz Stahlbau Do 30.07. - Mi 05.08. (bis Stammteam zurueck):
Chris - Stahlbau
Jorge - Stahlbau
+ 2 Leute Stahlbau: _____ / _____
-> davon 2 bleiben: Stahlbau-Feinschliff ab 05.08.

Notiz: _____
Notiz: _____
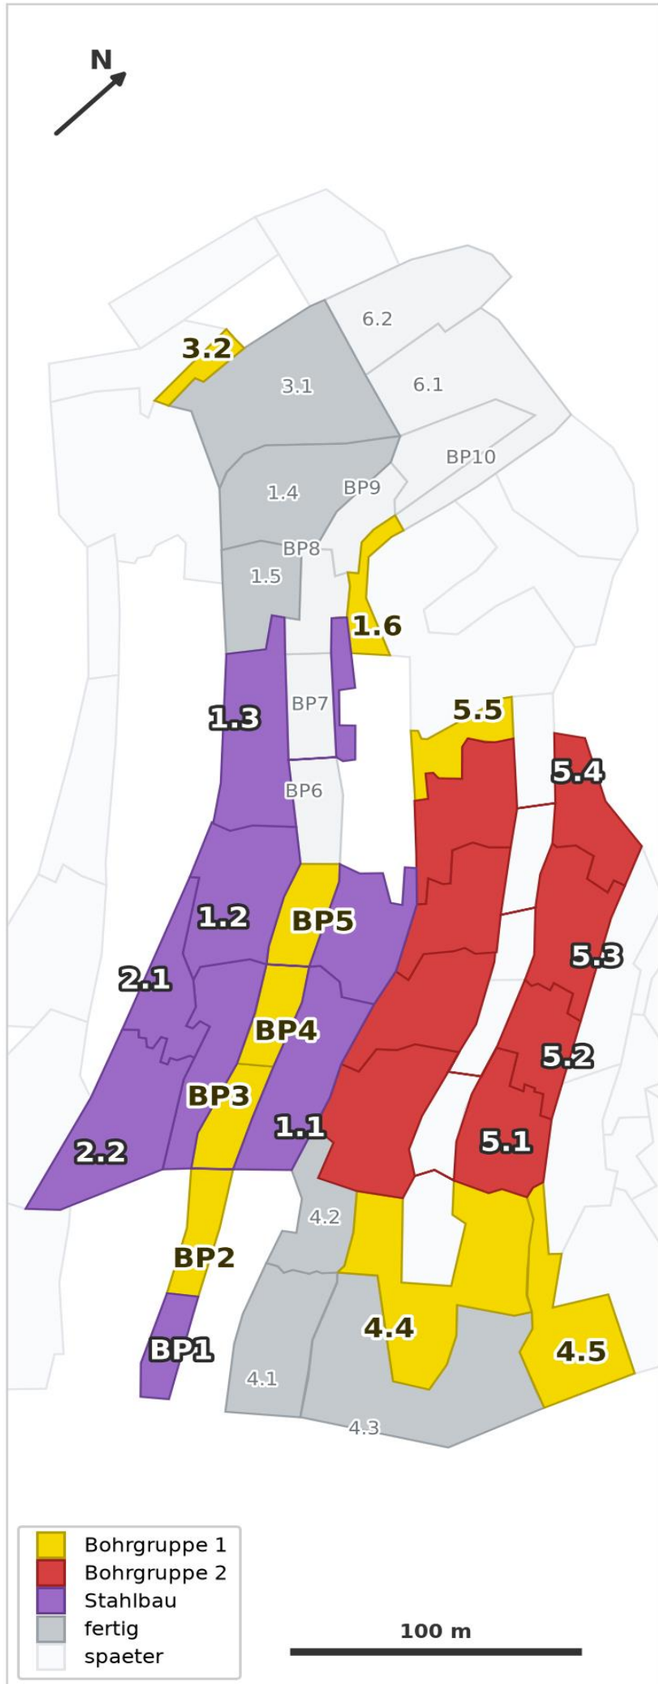
Bereiche | 5W-Programm KW30–34
