NalpSolar AG

Photovoltaikanlage NalpSolar

Thema **Baustellenanweisung**
Von nof
Datum 10.09.2026
Ref.-Nr. Anweisung-Nr.: NalpSolar_51_BA_0272_A1_MT-S-Fund-Garnitur_260910

Betreff **Anpassung Betongarnitur Einzelfundamente Typ D/E**

1. Baustellenanweisung zu folgenden Unterlagen:

- Dok.-Nr.: NalpSolar_51_PL_0284_A1_MT-S-Fundation_250505

2. Erläuterungen:

Die Garnituren der Betonfundamente Typ D/E müssen angepasst resp. verstärkt werden.

Folgende 10 bereits verbaute Betonfundamente sind betroffen:

ID	Typ	Jahr PK und KF	S	Serie	B / T	Aufbeton	Deckblechtyp	HAS-U HCR M27	HCC-K Verbinder DN12
364	E	E_KF2025	S2	MT2026, KF2025	B	ja	E 2025	4	24
349	E	E	S1	2026	T	nein	E 2026	4	-
344	E	E_KF2025	S1	MT2026, KF2025	T	nein	E 2025	4	-
297	E	E_KF2025	S4	MT2026, KF2025	T	nein	E 2025	4	-
1847	E	E_KF2025	S3	MT2026, KF2025	B	ja	E 2025	4	24
1847	E	E_KF2025	S4	MT2026, KF2025	T	nein	E 2025	4	-
1840	D	D_2025	S2	2025	B	ja	D 2025	4	24
1742	E	E_KF2025	S1	MT2026, KF2025	T	nein	E 2025	4	-
1741	E	E_KF2025	S2	MT2026, KF2025	B	ja	E 2025	4	24
1078	D	D	S1	2026	T	nein	D 2026	4	-
Anzahl							*20 Geometrie gem. Anhang*	*40*	*96*

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen und Ausführungsbestimmungen gelistet. Die geometrischen Details zu den Ausführungsbestimmungen sind dem Anhang zu entnehmen:

- Alle 10 Betonfundamente werden mit 2 zusätzlichen Deckblechen verstärkt.

NalpSolar AG
Via Tgamaura 1
7188 Sedrun

- Alle 10 Betonfundamente werden mit einem Vergussmörtel (SikaGrout-314 N oder gleichwertig) untergossen. Der Vergussmörtel ist dabei bis an die UK der bestehenden Fussplatte zu verfüllen. Auch die Langlöcher der verbauten Fussplatte sind zu verfüllen. Beim Verfüllen ist darauf zu achten, dass ein allfällige Luftblasenbildung unter der Fussplatte vermieden wird.
- Vor dem Untergiessen sind die Stützen mit Hilfe von Muttern unter der Fussplatte auf die Höhe zu justieren. Falls die Muttern zu klein sind, sollen Schiftbleche verwendet werden, die später vergossen werden können.
- Die bereits verbauten M20 Bügel sind nach Möglichkeit ebenso zu verschrauben.
- Je nach verbauter Serie unterscheiden sich die jeweiligen Deckbleche in ihrer Geometrie. Die Deckbleche haben alle eine Stärke von 30 mm. Die Details sind dem Anhang zu entnehmen. Der jeweilige Typ ist in der Spalte *Deckblechtyp* gelistet. Es resultieren folgende Anzahlen:
    - D 2025: 1 Betonfundament (2 Deckbleche)
    - E 2025: 7 Betonfundamente (14 Deckbleche)
    - D 2026: 1 Betonfundament (2 Deckbleche)
    - E 2026: 1 Betonfundament (2 Deckbleche)

- Jedes Deckblech wird typenunabhängig mit jeweils 2 x HAS-U HCR M27 mit einer Tiefe von 250 mm im Bestand verankert und mit passender Mutter und Unterlegscheibe verschraubt. Es resultiert folgende Anzahl an Ankerstangen:
    - HAS-U HCR M27, L_{min}=400 mm: 40 Stück (bei 20 Deckblechen)

- Die vier bergseitig angeordneten Betonfundamente (ID 364-S2, 1847-S3, 1840-S2 und 1741-S2) werden gemäss Anhang durch einen 20 cm starken Aufbeton verstärkt. Der Verbund zwischen Bestandsfundament und Aufbeton wird über eingeklebten HCC-K Schubverbinder DN 12 mit dem Injektionssystem HIT-HY 200-A V3 sichergestellt. Es resultiert folgende Anzahl an Schubverbinder:
    - HCC-K Verbinder, DN12, L=230 mm: 96 Stück (bei 4 Fundamenten)

- Die konstruktive Bewehrung des Aufbetons erfolgt mittels eines Bewehrungsnetzes K355. Es resultiert nachfolgende m2-Fläche Bewehrungsnetz:
    - K355-Netz: ca. 7 m^2 (bei 4 Fundamenten)

- Die 6 talseitig angeordneten Betonfundamente werden lediglich mit den Deckblechen inkl. Mörteluntergusss verstärkt. Zusätzlicher Aufbeton ist nicht erforderlich.
- Dort wo ein Aufbeton angeordnet, ist die bestehende Betonoberfläche über eine Höhe von 50 cm aufzurauen (Rauigkeit ca. 1.5 mm). Es wird empfohlen, die Betonoberfläche (ca. 6 m^2) durch leichtes Aufspitzen mit einem Hilti-Bohrhammer aufzurauen.


3. Verrechnung:

Die Verrechnung ist mit der Bauleitung zu definieren.


4. Sonstige Hinweise:

keine


Fussplatte C/D 2025
Massstab 1:5

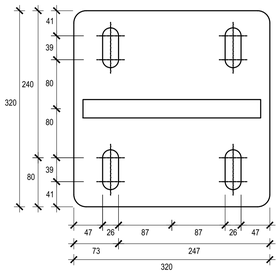


Deckblech C/D 2025
Massstab 1:5

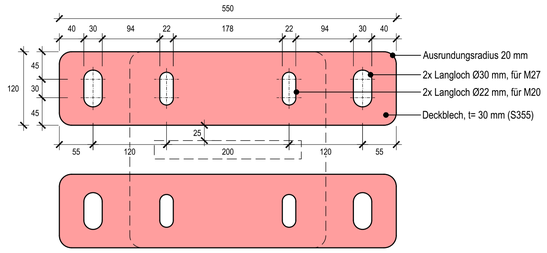


Fundament mit Deckblech C/D 2025
Massstab 1:10

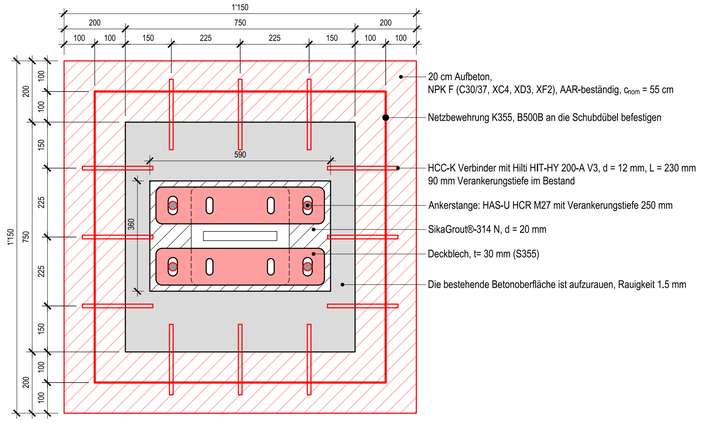


Fundament mit Deckblech D 2026
Massstab 1:10

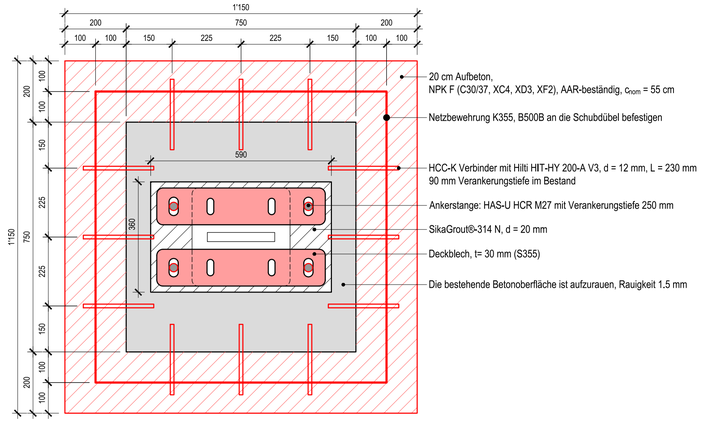


Fussplatte E 2025
Massstab 1:5

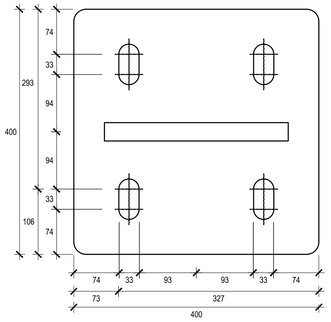


Deckblech E 2025
Massstab 1:5

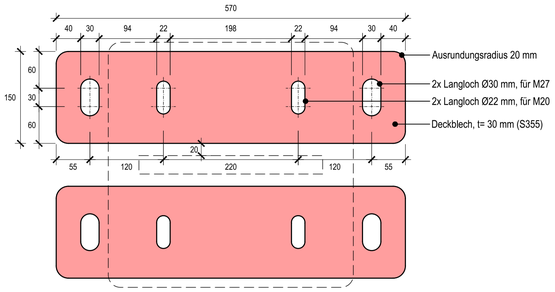


Fundament mit Deckblech E 2025
Massstab 1:10

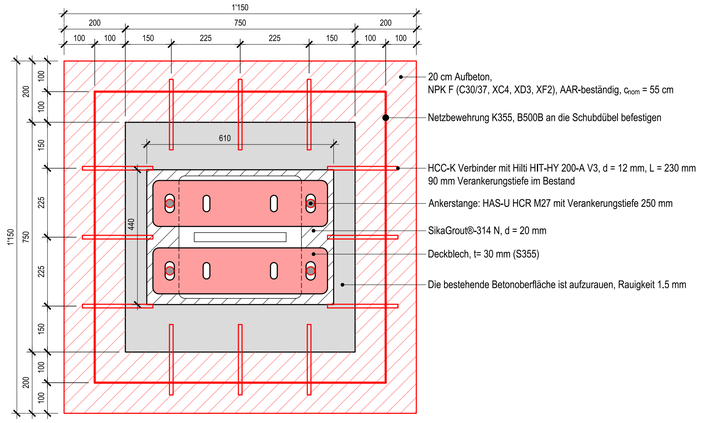


Fundament mit Deckblech E 2026
Massstab 1:10

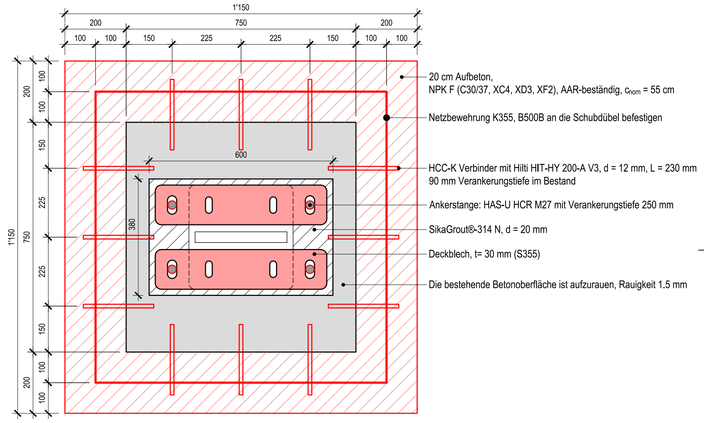


Fussplatte D 2026
Massstab 1:5

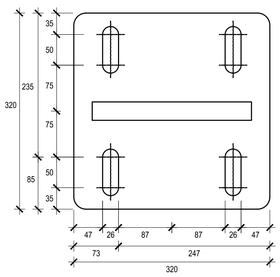


Deckblech D 2026
Massstab 1:5

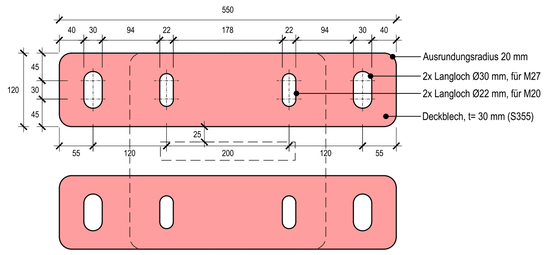

Schematische Schnitt

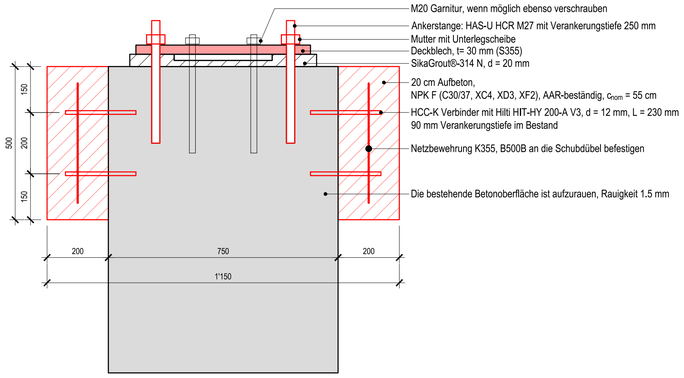

Fussplatte E 2026
Massstab 1:5

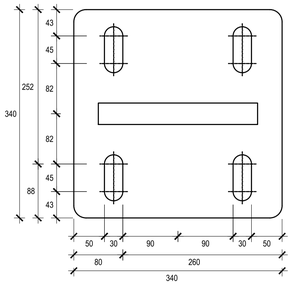

Deckblech E 2026
Massstab 1:5

