5-Wochenprogramm

20.07.2026

Baustelle **RKDO NalpSolar**
Polier **Samuel Decurtins**

A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug

	Woche 30							Woche 31							Woche 32							Woche 33							Woche 34						
	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N	V N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN																																			
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk																																			
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)																																			
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10																																			
26_4.3 GEBOHRT - Pfaehle einsetzen (Roter Kran, Boei)																																			
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - ab Mi 22.07. roter Muk, weiter oben																																			
Bohren 26_1.6 (25 Stz) - gelber Muk HEUTE runter (Mi 22.07.)																																			
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1																																			
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1																																			
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1																																			
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1																																			
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - Mo-Di roter Muk, Rest gelber Muk																																			
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwuestungen (76 Stz) G2																																			
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2																																			
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2																																			
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35																																			
INJEKTION 26_4.4 / 4.5 / 5.1 - Material Mo vorbereitet, Start Di 21.07.																																			
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten																																			
CKW-Kran Fiore ab KW31 HOCH (Berg) - CKW stoppt IP Tal 4																																			
2) STAHLBAU																																			
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke																																			
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07.								X																											
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																																			
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten																	X																		
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag)													X																						
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein																													X						
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)																																			
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert)																																			
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW																																			
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW																																			
PZ2025 PRIO 3 (1623, ...) -> CKW																																			
26_2.1 + 26_2.2 -> Start Do 23.07. (Stapel 45 frueh runter)																																			
STAMMTEAM FREI																																			
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - ohne Unterbruch																																			
26_2.1 + 26_2.2 FERTIG -> bis Mi 05.08. (KW32)																																			
8 Tische geaenderte Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3 - ab Do 06.08.																																			
Baupiste B2 / Etappe 2 (9 T.) - Passstuecke muessen da sein!																																			
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da																																			
Stapel 36 -> 26_2.1 folgt | Reserve: Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht																																			
Pfahlkopfplatten																																			
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt																																			
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen																																			
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)																																			
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)																																			
Modultraeger / Stapel																																			
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1																																			
Stapel 45 -> 26_2.1 (letzte Traeger heute Mi, Stapel Do 23.07. frueh runter)																																			
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2																																			
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31!)																																			
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)																																			
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrfaeche frei)																																			
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren																																			
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig																																			
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)																																			
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)																																			
FV Strang C: C3 / C2 unten																																			
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht																																			
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)																																			
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil																																			
Graben bis Schacht D1 fertigstellen																																			
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)																																			
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten															X?																				
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung)											X																								
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)																																			
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)																																			
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen																																			
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)																																			
4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.!)																																			
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen																																			
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen																																			
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4																																			
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)																																			
Ausschalen + Material wegraeumen																																			
Deponie raeumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung																																			
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<																																			
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT																																			
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig)	X																																		
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszaeunen (fertig Di abend)																																			
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07.											X																								
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg																																			
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)																																			
Loecher Bohrlafetten-Absetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen																																			
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08.																X																			
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27.-31.)	X																																		
Gewaesserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen																																			
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN																																			
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen | KSR DN60 Lager zaehlen | Baupisten PZ4 pruefen																																			
Personalbedarf (inkl. Polier)	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	22	22	0	0

Bemerkungen

Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi) Fabian Bissig Ferien KW30+31 | Reto Poehl krank Ias Rueras gesperrt bis 24.07. Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt -> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07.	Stahlbau-STAMMteam frei Do 30.07. - Di 04.08. -> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch (Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!) Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08.	Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Alexander Ferien 03.-14.08. | Luka Ferien Stahlbau: 2.1 + 2.2 fertig bis Mi 05.08., danach falsche Hoehen 1.1/1.2/1.3	Alexander + Luka Ferien Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli	Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter 26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35
---	---	---	---	---

PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Ersatz + Zusatz - Namen hier eintragen)

Alexander - FERIEN 2 Wochen (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Alexander (Feinverteilung): _____

Luca - FERIEN 4 Tage (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Luca (Feinverteilung): _____

Zusatz Stahlbau Do 30.07. - Mi 05.08. (bis Stammteam zurueck):
Chris - Stahlbau
Jorge - Stahlbau
+ 2 Leute Stahlbau: _____ / _____
-> davon 2 bleiben: Stahlbau-Feinschliff ab 05.08.

Notiz: _____
Notiz: _____
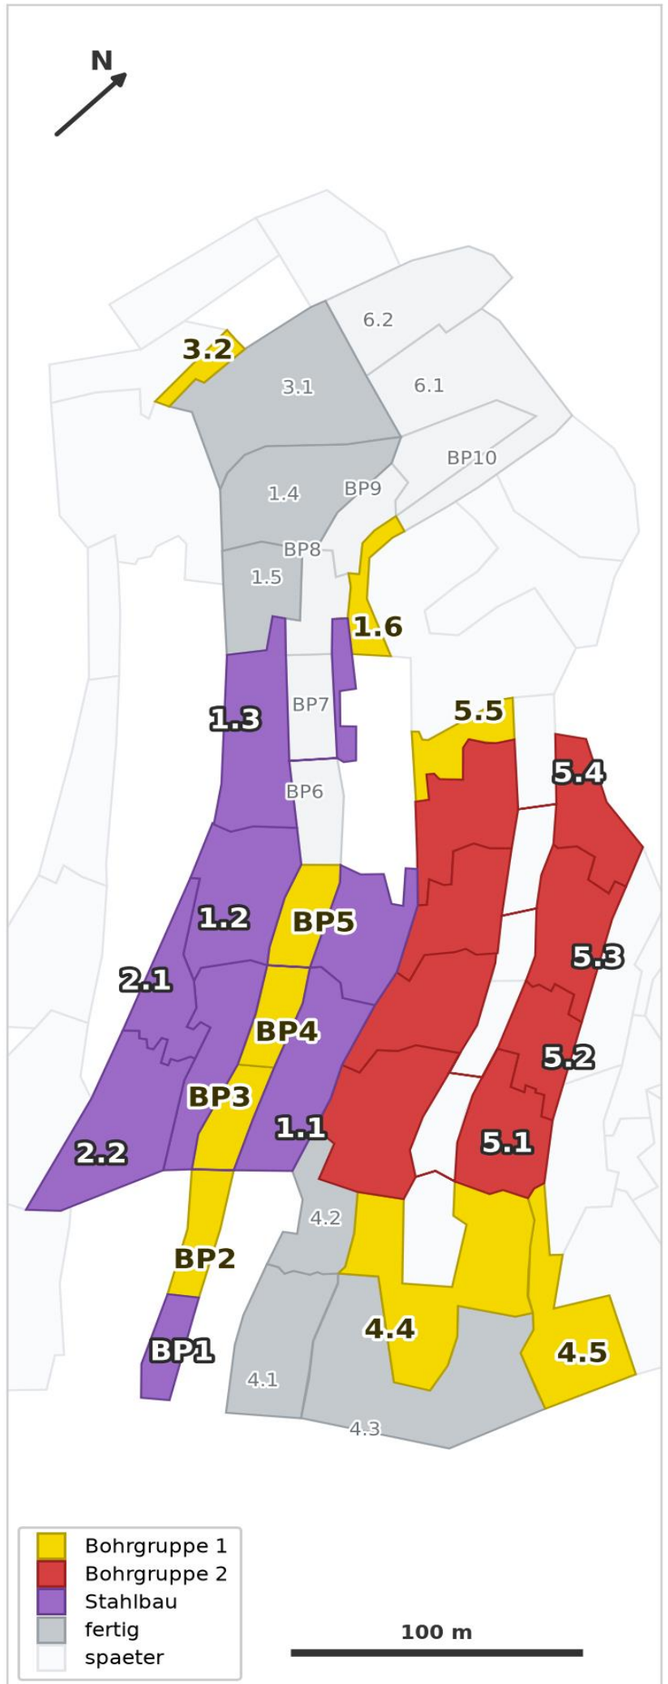
Bereiche | 5W-Programm KW30–34
